




























ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Work	Finish	Pred
1	Total Dealer's Website	90,75 days?	Mon 07/08/06	264 hrs	Mon 11/12/06	
2	Kickoff meeting	2 hrs	Wed 01/11/06	4 hrs	Wed 01/11/06	
3	Follow up sessions	75,13 days	Mon 07/08/06	6 hrs	Mon 20/11/06	
4	Work session #1	0,13 days	Mon 06/11/06	2 hrs	Mon 06/11/06	
5	Work session #2	0,13 days	Mon 07/08/06	2 hrs	Mon 07/08/06	
6	Work session #3	0,13 days	Mon 20/11/06	2 hrs	Mon 20/11/06	
7	Requirements	4,92 days	Wed 01/11/06	26 hrs	Tue 07/11/06	
8	Analysis and Requirements Elicitation	0,33 days	Wed 01/11/06	8 hrs	Wed 01/11/06	
9	Requirements Specifications	0,33 days	Wed 01/11/06	8 hrs	Wed 01/11/06	8
10	Requirement Specifications Report Elaboration	3,75 days	Wed 01/11/06	6 hrs	Tue 07/11/06	9
11	<i>Document Turn in to the Total Project Team for revision</i>	<i>0 days</i>	<i>Tue 07/11/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>Tue 07/11/06</i>	<i>10</i>
12	Total Project Team's document revision	0 days	Tue 07/11/06	0 hrs	Tue 07/11/06	11
13	<i>Recommended document adjustments reception</i>	<i>0 days</i>	<i>Tue 07/11/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>Tue 07/11/06</i>	<i>12</i>
14	Requirement Specification Report Adjustements	0,5 days	Tue 07/11/06	4 hrs	Tue 07/11/06	13
15	<i>Document Turn in to the Total Project Team for approval</i>	<i>0 days</i>	<i>Tue 07/11/06</i>	<i>0 hrs</i>	<i>Tue 07/11/06</i>	<i>14</i>
16	Requirement Specification Report Approval	0 days	Tue 07/11/06	0 hrs	Tue 07/11/06	
17	Requirement Specification Report Approved	0 days	Tue 07/11/06	0 hrs	Tue 07/11/06	16
18	Base information preparation for the implementation	1,25 days	Tue 07/11/06	9 hrs	Wed 08/11/06	
19	Data Model Definition and Documentation	0,5 days	Tue 07/11/06	8 hrs	Tue 07/11/06	
20	BackOffice Profiles Definition	0,25 days	Wed 08/11/06	1 hr	Wed 08/11/06	
21	Design Specifications	0 days?	Tue 07/11/06	0 hrs	Tue 07/11/06	
22	Design Document turn in (colors, typography, images, web	0 days?	Tue 07/11/06	0 hrs	Tue 07/11/06	
23	Configuration and Development	22 days	Wed 08/11/06	151 hrs	Thu 07/12/06	21
24	WIB3 Application Configuration	0,5 days	Wed 08/11/06	2 hrs	Wed 08/11/06	
25	N2C Application Configuration	0,5 days	Thu 09/11/06	2 hrs	Thu 09/11/06	
26	WIB3 Configuration	4 days	Thu 09/11/06	16 hrs	Tue 14/11/06	
27	General Web Site Template Definition (Page Divisions, General Style, Site Assistant)	3 days	Thu 09/11/06	12 hrs	Mon 13/11/06	
28	Page Definition (Content Pages, Application Pages)	1 day	Tue 14/11/06	4 hrs	Tue 14/11/06	27
29	Functionalities Implementation	18 days	Tue 14/11/06	131 hrs	Thu 07/12/06	
30	News	1,5 days	Tue 14/11/06	8 hrs	Wed 15/11/06	
31	Public Home and User Home News	1 day	Tue 14/11/06	4 hrs	Tue 14/11/06	

Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Mon 30/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Work	Finish	Pred
32	Dealerpanel News	0,5 days	Wed 15/11/06	4 hrs	Wed 15/11/06	31
33	Public Home and User Home Poll	1,5 days	Wed 15/11/06	12 hrs	Thu 16/11/06	
34	Marketing Actions	2 days	Fri 17/11/06	16 hrs	Mon 20/11/06	
35	Pulbic and User Home Marketing Actions	1,5 days	Fri 17/11/06	12 hrs	Mon 20/11/06	
36	Retail-Marketing Actions	0,5 days	Mon 20/11/06	4 hrs	Mon 20/11/06	35
37	Login/Logout/ Password Change	1 day	Mon 20/11/06	4 hrs	Mon 20/11/06	
38	User Registration	1,5 days	Tue 21/11/06	12 hrs	Wed 22/11/06	37
39	Price Chart (Like to have)	1 day	Wed 22/11/06	8 hrs	Wed 22/11/06	
40	Links Page (Linkpagina)	1 day	Thu 23/11/06	4 hrs	Thu 23/11/06	39
41	Mailings	4 days	Fri 24/11/06	16 hrs	Wed 29/11/06	
42	User home Mailing	2 days	Fri 24/11/06	8 hrs	Mon 27/11/06	
43	Retail-Marketing Mailing	0,25 days	Tue 28/11/06	1 hr	Tue 28/11/06	42
44	Retail-Top Service & Training Mailing	0,25 days	Tue 28/11/06	1 hr	Tue 28/11/06	43
45	Retail-Shop Food & Services Mailing	0,25 days	Tue 28/11/06	1 hr	Tue 28/11/06	44
46	Retail-Enginoring Mailing	0,25 days	Tue 28/11/06	1 hr	Tue 28/11/06	45
47	Retail-Customer Service Mailing	0,25 days	Wed 29/11/06	1 hr	Wed 29/11/06	46
48	Retail-Power Points Mailing	0,25 days	Wed 29/11/06	1 hr	Wed 29/11/06	47
49	Cards Mailings	0,25 days	Wed 29/11/06	1 hr	Wed 29/11/06	48
50	Lubricants Mailings	0,25 days	Wed 29/11/06	1 hr	Wed 29/11/06	49
51	Pesonal Agenda	1 day	Wed 29/11/06	8 hrs	Wed 29/11/06	
52	Meeting Agenda	1,5 days	Thu 30/11/06	12 hrs	Fri 01/12/06	
53	Contact Forms	3,75 days	Mon 04/12/06	15 hrs	Thu 07/12/06	
54	Retail-Sales Contact	1,5 days	Mon 04/12/06	8 hrs	Tue 05/12/06	
55	Retail-Marketing Contact	0,25 days	Tue 05/12/06	1 hr	Tue 05/12/06	54
56	Retail-Top Service & Training Contact	0,25 days	Tue 05/12/06	1 hr	Tue 05/12/06	55
57	Retail-Shop Food & Services Contact	0,25 days	Wed 06/12/06	1 hr	Wed 06/12/06	56
58	Retail-Customer Service Contact	0,25 days	Wed 06/12/06	1 hr	Wed 06/12/06	57
59	Retail-Power Points Contact	0,25 days	Wed 06/12/06	1 hr	Wed 06/12/06	58
60	Cards Contact	0,5 days	Wed 06/12/06	1 hr	Thu 07/12/06	59
61	Dealerpanel Contact	0,5 days	Thu 07/12/06	1 hr	Thu 07/12/06	60
62	Acts Module	1 day	Thu 07/12/06	16 hrs	Thu 07/12/06	
63	Testing Plan	0,5 days	Fri 08/12/06	8 hrs	Fri 08/12/06	23

Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Mon 30/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	
Página 2						










ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Work	Finish	Pred
64	Testing Plan Elaboration	0,24 days	Fri 08/12/06	4 hrs	Fri 08/12/06	23
65	Testing Plan revision with Total Work Team	0,5 days	Fri 08/12/06	2 hrs	Fri 08/12/06	
66	Recommended Adjustments to the Testing Plan	0,25 days	Fri 08/12/06	2 hrs	Fri 08/12/06	
67	Revised Testing Plan	0,5 days	Fri 08/12/06	0 hrs	Fri 08/12/06	
68	Certification Testing	1 day	Fri 08/12/06	28 hrs	Mon 11/12/06	63
69	Testing Preparation	0,25 days	Fri 08/12/06	4 hrs	Fri 08/12/06	
70	Functionalities Testing	1 day	Fri 08/12/06	8 hrs	Mon 11/12/06	
71	Recommended Adjustments	0,67 days	Fri 08/12/06	16 hrs	Mon 11/12/06	
72	Certified Testing	0 days	Fri 08/12/06	0 hrs	Fri 08/12/06	
73	Documentation	23,29 days	Tue 07/11/06	20 hrs	Fri 08/12/06	
74	Technical documentation consolidation and structuring	1 day	Tue 07/11/06	16 hrs	Tue 07/11/06	21
75	Documentation Adjustements	0,29 days	Fri 08/12/06	4 hrs	Fri 08/12/06	23
76	Project Management	1 day?	Mon 23/10/06	8 hrs	Mon 23/10/06	
77	Planification	1 day?	Mon 23/10/06	8 hrs	Mon 23/10/06	
78	Project Closure	0,25 days	Mon 11/12/06	4 hrs	Mon 11/12/06	68
79	Project Closure Presentation Elaboration	0,25 days	Mon 11/12/06	2 hrs	Mon 11/12/06	
80	Project Closure Meeting	0,25 days	Mon 11/12/06	2 hrs	Mon 11/12/06	

Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Mon 30/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	










Recursos	Wed 02	Fri 04 Au	Sun 06 A	Tue 08 A	Thu 10 A	Sat 12 A	Mon 14 A	Wed 16	Fri 18 Au	Sun 20 A	Tue 22 A	Thu 24 A	Sat 26 A	Mon 28	Wed 30
Beta (GWT);Listbeth (GWT)			▶												
Beta (GWT);Listbeth (GWT)			▶												
Beta (GWT);Listbeth (GWT)			▶												
Beta (GWT);Listbeth (GWT)			▶												
Listbeth (GWT);Beta (GWT);Gus			▶												
Listbeth (GWT);Beta (GWT);Gus			▶												
Listbeth (GWT)[10%];Gustavo (C			▶												
Arne (Tierra)[10%]			▶												
Arne (Tierra)[10%]			▶												
Listbeth (GWT)[10%]			▶												
Beta (GWT)[50%];Gustavo (GWT			▶												
Arne (Tierra)[10%]			▶												
Arne (Tierra)[10%]			▶												
Arne (Tierra)[10%]			▶												
Beta (GWT);Gustavo (GWT)			▶												
Beta (GWT)[50%]			▶												
Arne (Tierra)[10%]			▶												
Gustavo (GWT)[50%]			▶												
Leonel (GWT)[50%]			▶												
Beta (GWT)[50%]			▶												
Leonel (GWT)[50%]			▶												
Gustavo (GWT)[50%]			▶												

Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Mon 30/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	


Recursos	Wed 02	Fri 04 Au	Sun 06 A	Tue 08 A	Thu 10 A	Sat 12 A	Mon 14 A	Wed 16	Fri 18 Au	Sun 20 A	Tue 22 A	Thu 24 A	Sat 26 A	Mon 28	Wed 30
Leonel (GWT)															
Leonel (GWT)[50%];Gustavo (G															
Leonel (GWT)															
Beta (GWT)[50%]															
Gustavo (GWT)															
Leonel (GWT)															
Leonel (GWT)[50%]															
Beta (GWT)[50%]															
Beta (GWT)[50%]															
Beta (GWT)[50%]															
Beta (GWT)[50%]															
Beta (GWT)[50%]															
Beta (GWT)[50%]															
Beta (GWT)[50%]															
Beta (GWT)[50%]															
Beta (GWT)[50%]															
Leonel (GWT)															
Gustavo (GWT)															
Leonel (GWT)[67%]															
Leonel (GWT)[50%]															
Leonel (GWT)[50%]															
Leonel (GWT)[50%]															
Leonel (GWT)[50%]															
Leonel (GWT)[50%]															
Leonel (GWT)[25%]															
Leonel (GWT)[25%]															
Gustavo (GWT);Beta (GWT)															
Beta (GWT)[50%];Gustavo (GWT)															

Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Mon 30/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	



Recursos	Wed 02	Fri 04 Au	Sun 06 A	Tue 08 A	Thu 10 A	Sat 12 A	Mon 14 A	Wed 16	Fri 18 Au	Sun 20 A	Tue 22 A	Thu 24 A	Sat 26 A	Mon 28	Wed 30
Arne (Tierra)[50%]															
Beta (GWT)[50%];Gustavo (GWT)															
Gustavo (GWT);Beta (GWT)															
Aron (GWT)															
Beta (GWT);Gustavo (GWT);Leo															
Arne (Tierra)[10%]															
Leonel (GWT);Gustavo (GWT)[5]															
Beta (GWT)[50%];Gustavo (GWT)															
Listbeth (GWT)[50%];Beta (GWT)															
Listbeth (GWT)[50%];Beta (GWT)															

Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Mon 30/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

Fri 01 Se	Sun 03 S	Tue 05 S	Thu 07 S	Sat 09 S	Mon 11	Wed 13	Fri 15 Se	Sun 17 S	Tue 19 S	Thu 21 S	Sat 23 S	Mon 25	Wed 27	Fri 29 Se	Sun 01 O	Tue 03 O	Thu 05 O	Sat 07 O
-----------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	-----------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	-----------	----------	----------	----------	----------

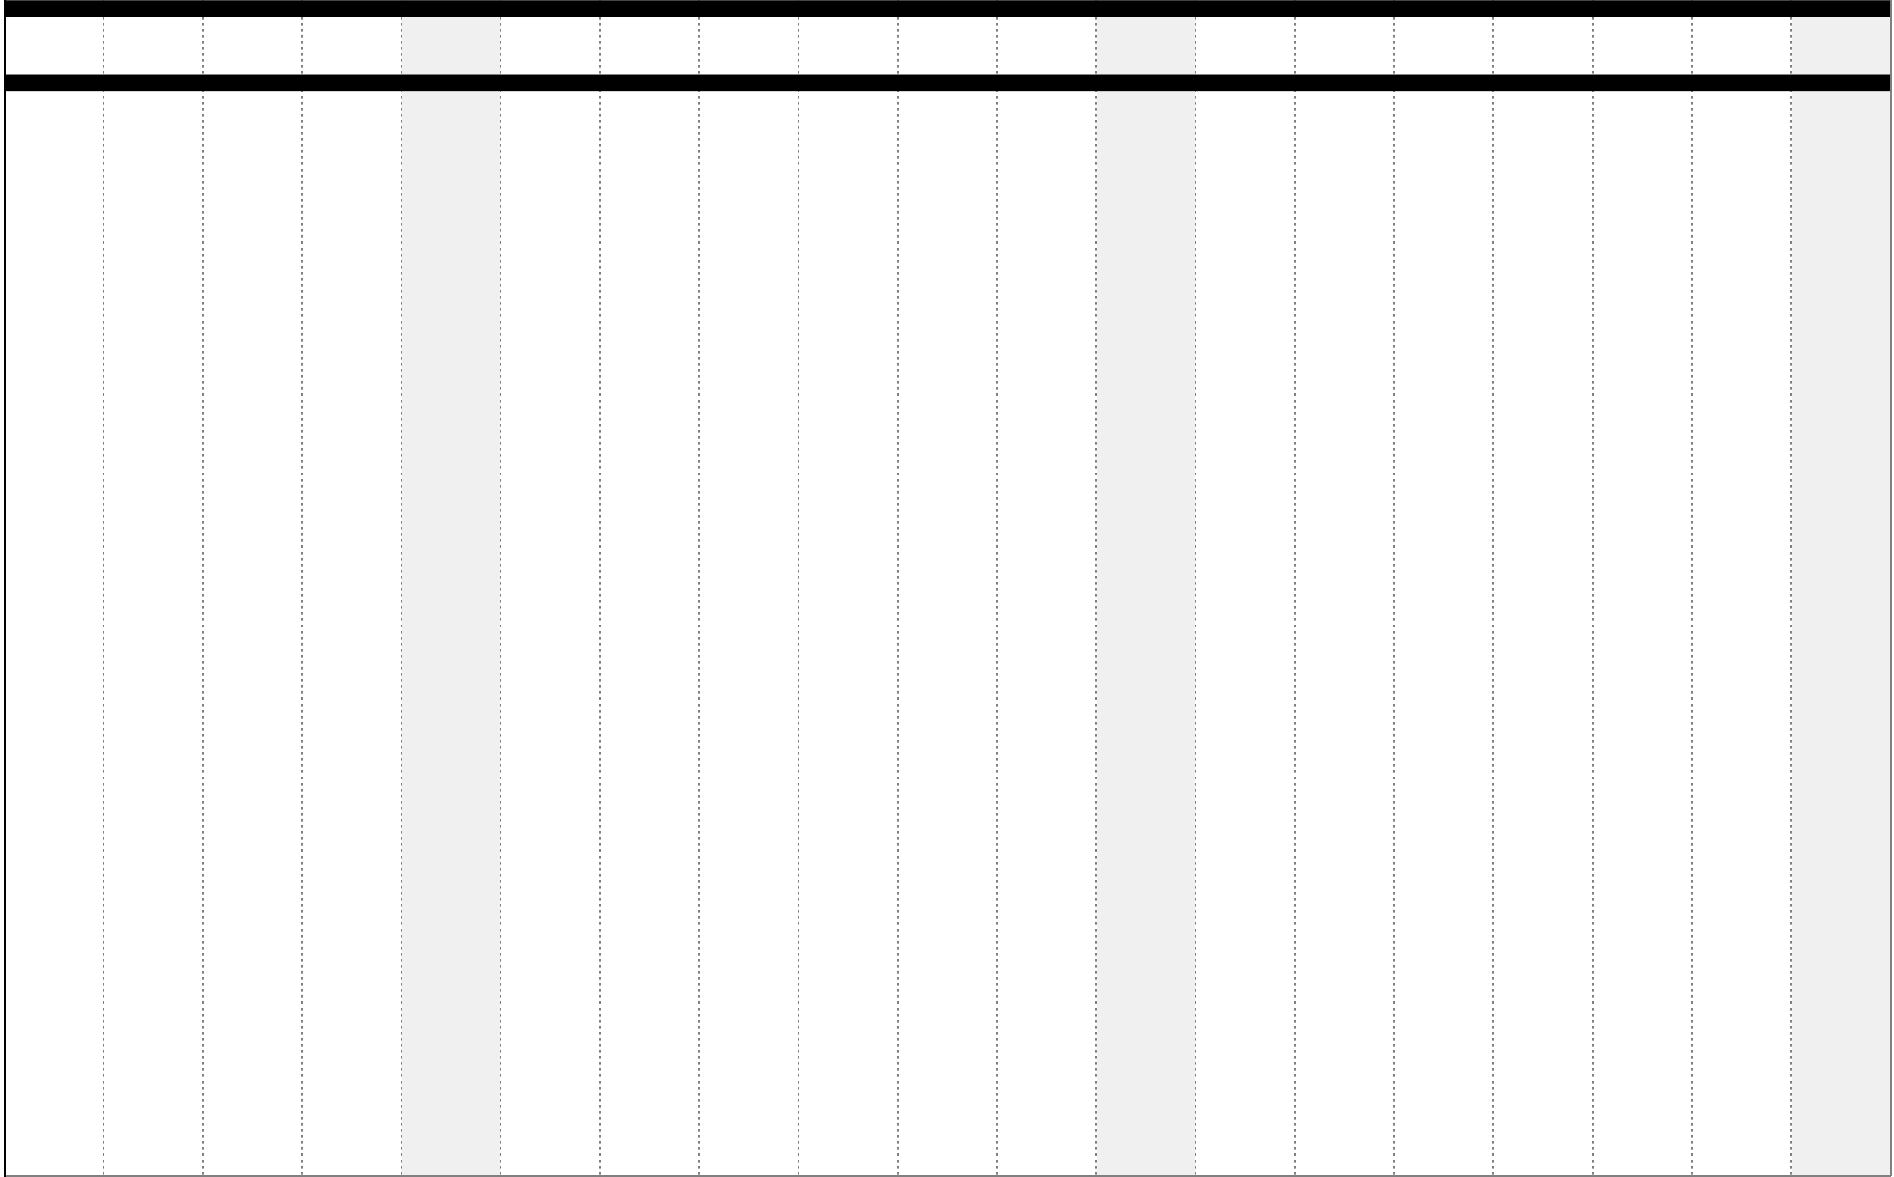

Proyecto: Proyecto CRM - Corpor
 Fecha: Mon 30/10/06










Tarea		Hito		Tareas externas	
División		Resumen		Hito externo	
Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	


Fri 01 Se	Sun 03 S	Tue 05 S	Thu 07 S	Sat 09 S	Mon 11	Wed 13	Fri 15 Se	Sun 17 S	Tue 19 S	Thu 21 S	Sat 23 S	Mon 25	Wed 27	Fri 29 Se	Sun 01 O	Tue 03 O	Thu 05 O	Sat 07 O

Proyecto: Proyecto CRM - Corpor
 Fecha: Mon 30/10/06

Tarea		Hito		Tareas externas	
División		Resumen		Hito externo	
Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

Fri 01 Se	Sun 03 S	Tue 05 S	Thu 07 S	Sat 09 S	Mon 11	Wed 13	Fri 15 Se	Sun 17 S	Tue 19 S	Thu 21 S	Sat 23 S	Mon 25	Wed 27	Fri 29 Se	Sun 01 O	Tue 03 O	Thu 05 O	Sat 07 O






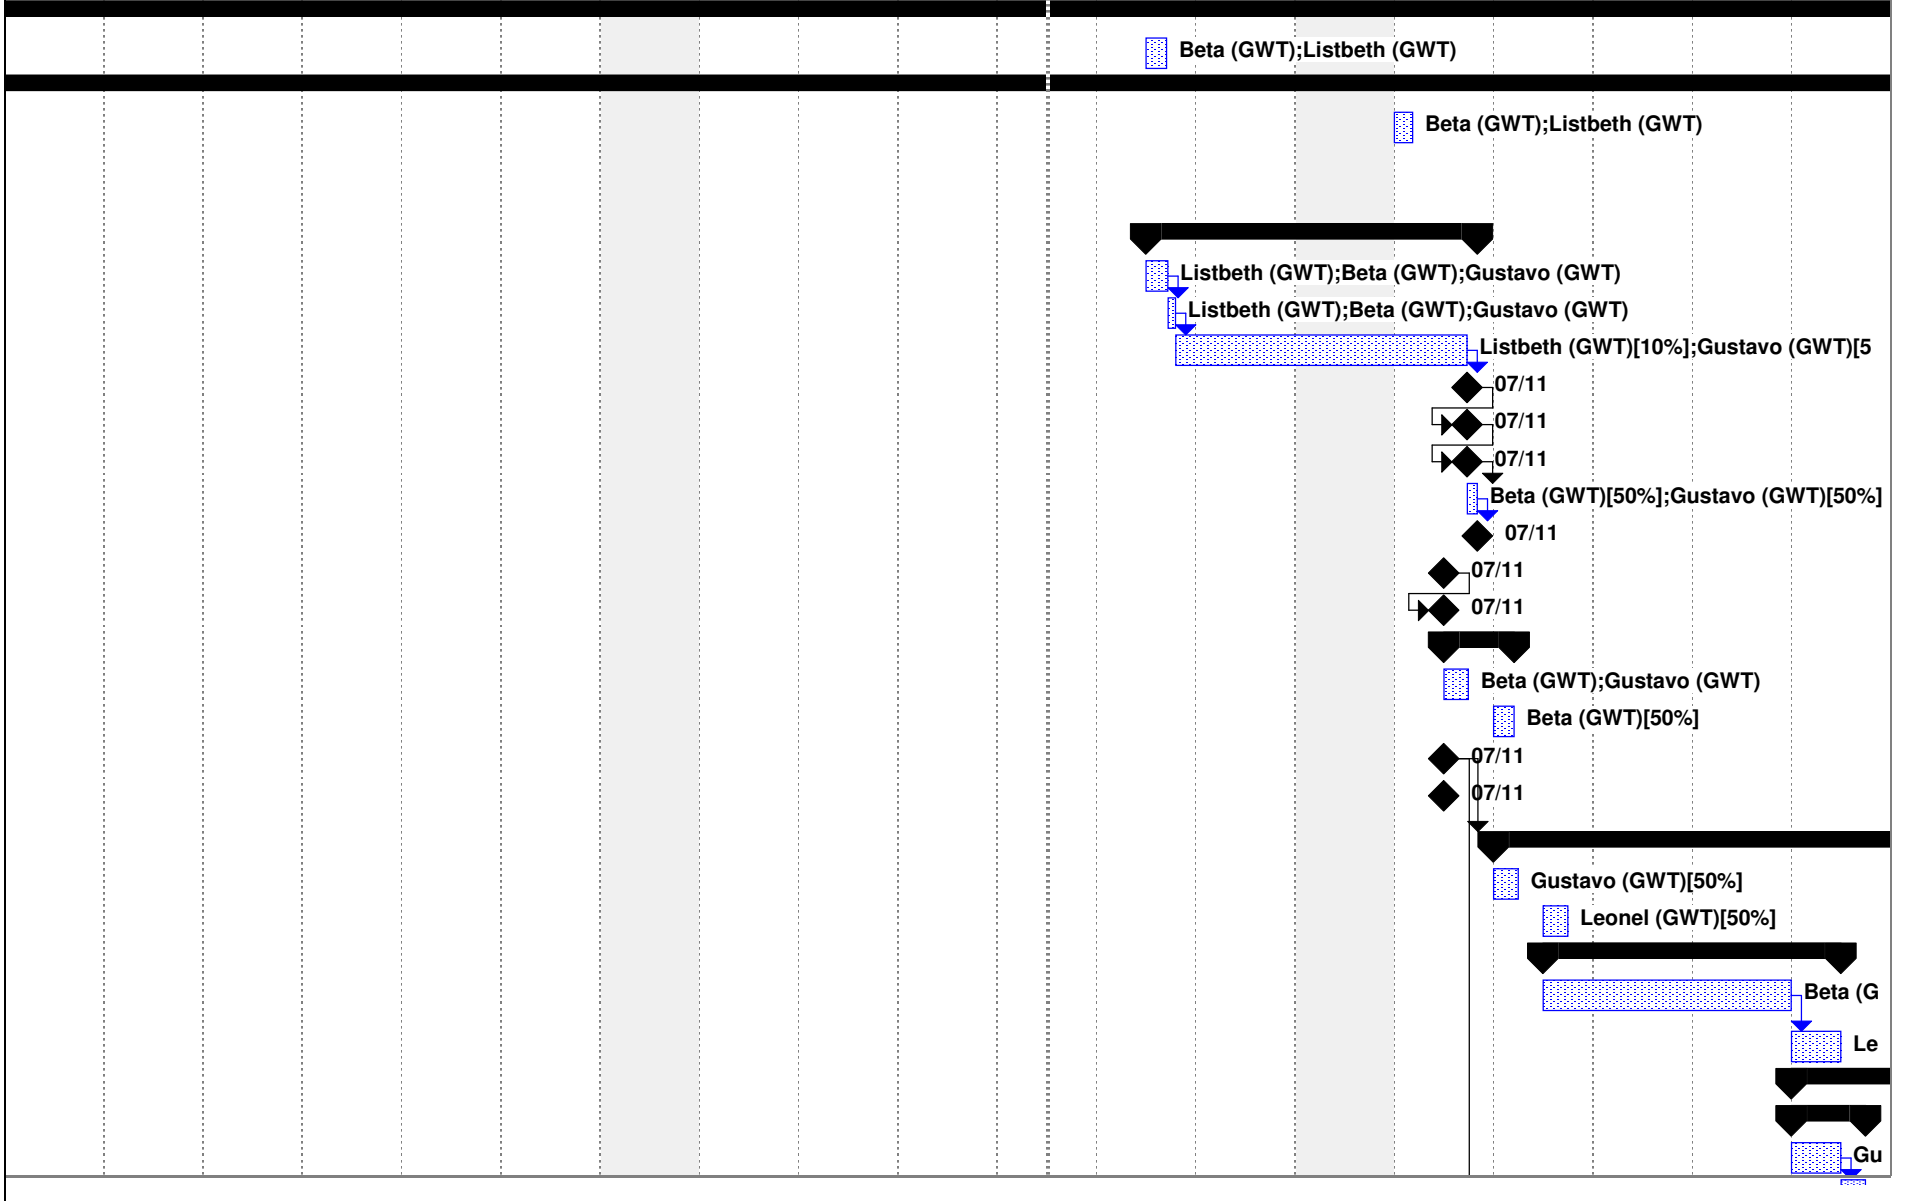



Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Mon 30/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	




Proyecto: Proyecto CRM - Corpor
 Fecha: Mon 30/10/06




Tarea		Hito		Tareas externas	
División		Resumen		Hito externo	
Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

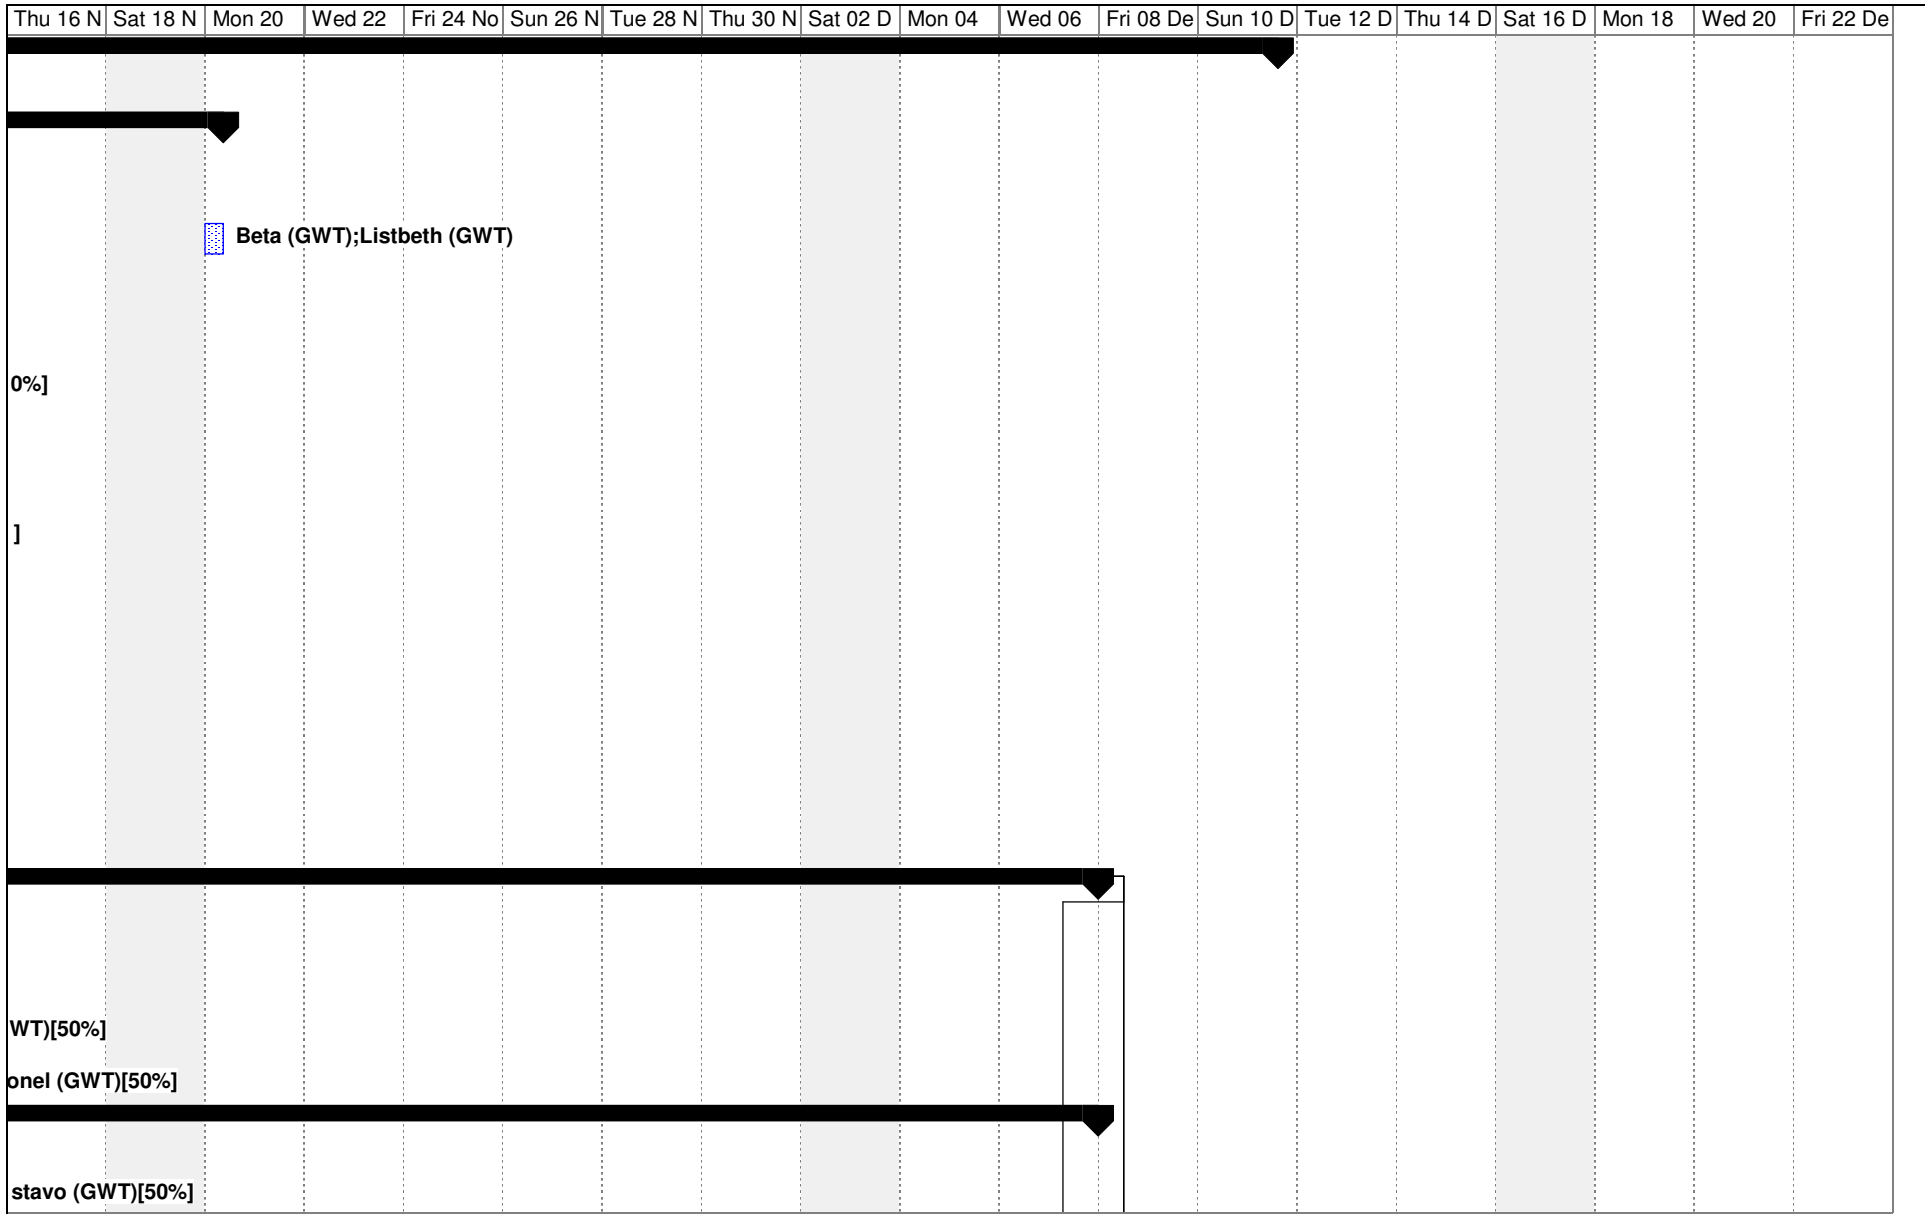


Mon 09	Wed 11	Fri 13 Oc	Sun 15 O	Tue 17 O	Thu 19 O	Sat 21 O	Mon 23	Wed 25	Fri 27 Oc	Sun 29 O	Tue 31 O	Thu 02 N	Sat 04 N	Mon 06	Wed 08	Fri 10 No	Sun 12 N	Tue 14 N	


Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Mon 30/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	




Proyecto: Proyecto CRM - Corpor
 Fecha: Mon 30/10/06


Tarea 
 División 
 Progreso 

Hito 
 Resumen 
 Resumen del proyecto 

Tareas externas 
 Hito externo 
 Fecha límite 

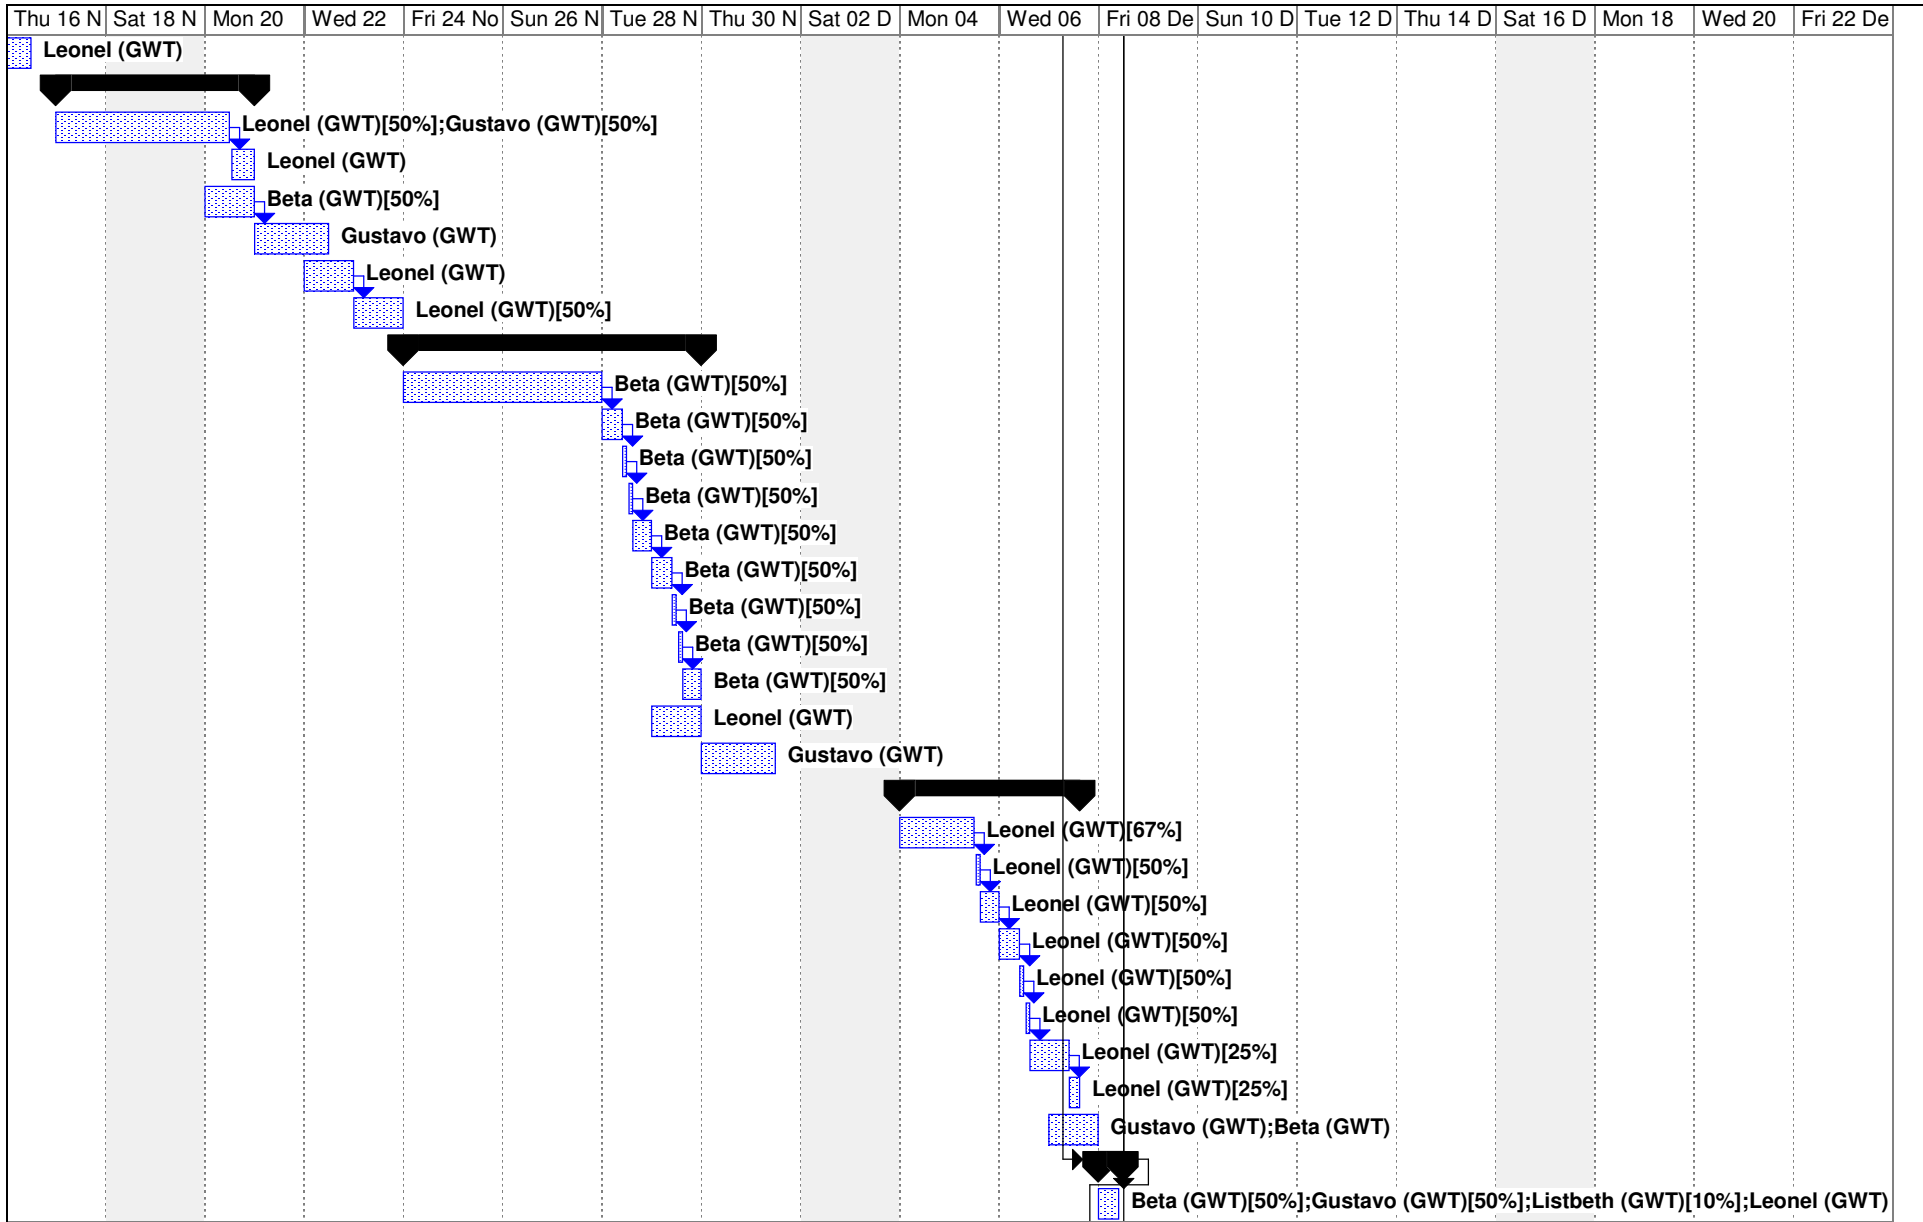






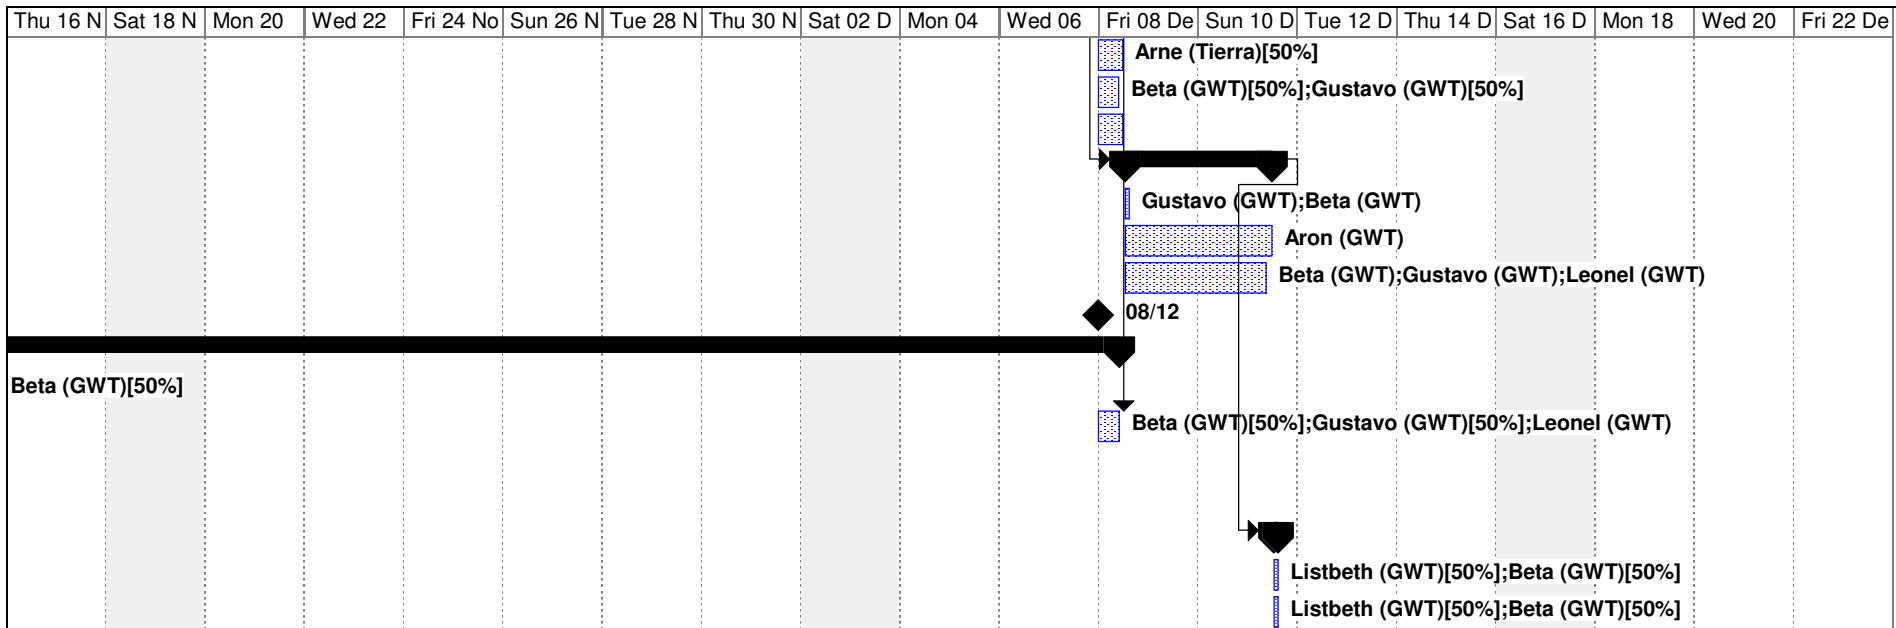



Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Mon 30/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	



Proyecto: Proyecto CRM - Corpor
 Fecha: Mon 30/10/06










Tarea		Hito		Tareas externas	
División		Resumen		Hito externo	
Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

Sun 24 D	Tue 26 D	Thu 28 D	Sat 30 D	Mon 01 J	Wed 03	Fri 05 Ja	Sun 07 J	Tue 09 J	Thu 11 J	Sat 13 Ja	Mon 15 J	Wed 17	Fri 19 Ja	Sun 21 J	Tue 23 J	Thu 25 J	Sat 27 Ja	Mon 29 J









Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Mon 30/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

Sun 24 D	Tue 26 D	Thu 28 D	Sat 30 D	Mon 01 J	Wed 03	Fri 05 Ja	Sun 07 J	Tue 09 J	Thu 11 J	Sat 13 Ja	Mon 15 J	Wed 17	Fri 19 Ja	Sun 21 J	Tue 23 J	Thu 25 J	Sat 27 Ja	Mon 29 J

T)

Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Mon 30/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

Sun 24 D	Tue 26 D	Thu 28 D	Sat 30 D	Mon 01 J	Wed 03	Fri 05 Ja	Sun 07 J	Tue 09 J	Thu 11 J	Sat 13 Ja	Mon 15 J	Wed 17	Fri 19 Ja	Sun 21 J	Tue 23 J	Thu 25 J	Sat 27 Ja	Mon 29 J

Proyecto: Proyecto CRM - Corpor Fecha: Mon 30/10/06	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	
