


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Trabajo	% completado	abri
1	Cines Unidos	205,5 días	jue 03/05/07	vie 22/02/08	5.146,4 horas	34%	
2	Reunión de Arranque (Kickoff)	0,25 días	jue 03/05/07	jue 03/05/07	8 horas	100%	
3	Etapa I - Preparandonos para la Independencia	101,1 días	vie 04/05/07	mié 26/09/07	2.670,4 horas	56%	
4	Fase I - Levantamiento de Información	30 días	vie 04/05/07	vie 15/06/07	450 horas	100%	
5	Levantamiento Info (Visita al Cine)	0,5 días	vie 04/05/07	vie 04/05/07	24 horas	100%	
6	Inducción Cines Unidos	2 días	mié 09/05/07	vie 11/05/07	24 horas	100%	
7	Presentación N2C y CRM	0,38 días	mié 09/05/07	mié 09/05/07	9 horas	100%	
8	Modelo de Procesos	7,5 días	lun 14/05/07	mié 23/05/07	64 horas	100%	
9	Preparación para Mesas de Trabajo	0,25 días	lun 14/05/07	lun 14/05/07	8 horas	100%	
10	Mesa de Trabajo # 1	0,5 días	mar 15/05/07	mar 15/05/07	16 horas	100%	
11	Mesa de Trabajo # 2	0,5 días	jue 17/05/07	jue 17/05/07	16 horas	100%	
12	Mesa de Trabajo # 3	0,5 días	mié 23/05/07	mié 23/05/07	16 horas	100%	
13	Documentación Modelo de Procesos	4 días	jue 17/05/07	mar 22/05/07	8 horas	100%	
14	Modelo de Datos	10 días	mar 22/05/07	lun 04/06/07	72 horas	100%	
15	Análisis Modelo de Datos Actual	0,25 días	mar 22/05/07	mar 22/05/07	8 horas	100%	
16	Elaboración Modelo de Datos Preliminar	1 día	jue 24/05/07	vie 25/05/07	16 horas	100%	
17	Mesa de Trabajo - Kernel	0,5 días	mié 30/05/07	mié 30/05/07	24 horas	100%	
18	Mesa de Trabajo # 4 (Sist CU - GWT)	0,5 días	jue 31/05/07	jue 31/05/07	16 horas	100%	
19	Ajustes al Modelo	2 días	vie 01/06/07	lun 04/06/07	8 horas	100%	
20	Configuración Ambiente de Desarrollo	10 días	mar 29/05/07	mar 12/06/07	152 horas	100%	
21	Análisis Req. Adiestramiento configuración e instalación de Vista y MegaSoft	2 días	mar 29/05/07	mié 30/05/07	64 horas	100%	
22	Instalación y configuración de ambiente a imagen y semejanza de ambiente de producción de Cines Unidos	6 días	lun 04/06/07	mar 12/06/07	72 horas	100%	
23	Configuración de VPN para acceso remoto	5,33 días	lun 04/06/07	lun 11/06/07	16 horas	100%	
24	Infraestructura a Futuro	20 días	lun 14/05/07	vie 08/06/07	77 horas	100%	
25	Investigación de requerimientos de infraestructura	15 días	lun 14/05/07	vie 01/06/07	60 horas	100%	
26	Elaborar informe	5 días	lun 04/06/07	vie 08/06/07	17 horas	100%	
27	Informe de Especificación de Requerimientos	10,5 días	jue 31/05/07	vie 15/06/07	28 horas	100%	
28	Elaboración del Informe de Especificación de Requerimientos	3 días	jue 31/05/07	mar 05/06/07	20 horas	100%	
29	Entrega al Equipo de Proyecto CU para su revisión	0 días	mar 05/06/07	mar 05/06/07	0 horas	100%	
30	Revisión por parte del Equipo de Proyecto CU	2 días	mié 06/06/07	vie 08/06/07	0 horas	100%	
31	Ajustes al Informe Especificación de Requerimientos	2 días	lun 11/06/07	mar 12/06/07	8 horas	100%	
32	Entrega de Especificación de Req. para aprobación	0 días	mar 12/06/07	mar 12/06/07	0 horas	100%	
33	Aprobación del Informe Especificación de Requerimientos	0 días	vie 15/06/07	vie 15/06/07	0 horas	100%	
34	Informe Especificación de Requerimientos Aprobado	0 días	vie 15/06/07	vie 15/06/07	0 horas	100%	
35	Modelo de Procesos Definido	0 días	vie 15/06/07	vie 15/06/07	0 horas	100%	
36	Modelo de Datos Definido	0 días	vie 15/06/07	vie 15/06/07	0 horas	100%	


Proyecto: Planning Cines Unidos
Fecha: lun 27/08/07

Tarea 

Hito 


Tareas externas 

División 

Resumen 

Hito exteTarea 

Progreso 

Resumen del proyecto 

División 

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Trabajo	% completado	abri
37	Informe Infraestructura y Crecimiento Futuro	0 días	vie 15/06/07	vie 15/06/07	0 horas	100%	
38	Fase II - Conformación de las bases	38,5 días	mié 06/06/07	mié 01/08/07	546,4 horas	91%	
39	Directorio de Clientes y CRM	13 días	mié 06/06/07	vie 22/06/07	250,4 horas	81%	
40	Análisis de Base de Datos de Clientes y Transacciones del proveedor actual (BD)	0,5 días	mié 06/06/07	mié 06/06/07	20 horas	100%	
41	Equivalencia entre la base de datos del Proveedor Actual vs. lo levantado	0,5 días	jue 07/06/07	jue 07/06/07	20 horas	100%	
42	Crear en N2C la nueva estructura de la B.D de Clientes	1 día	jue 07/06/07	vie 08/06/07	18,4 horas	100%	
43	Configuración Directorio de Clientes	4 días	vie 08/06/07	jue 14/06/07	32 horas	100%	
44	Carga inicial de datos de Clientes y Transacciones en N2C	3 días	jue 14/06/07	mar 19/06/07	40 horas	10%	
45	Implementar mecanismo de carga diaria de datos provenientes del Proveedor Actual a Cines Unidos	1 día	mar 19/06/07	mié 20/06/07	16 horas	80%	
46	Implementar facilidad de monitoreo quincenal de los datos para su depuración	1 día	mié 20/06/07	jue 21/06/07	24 horas	0%	
47	Envío de correos masivos con políticas de colas y administración de mensajes devueltos	4 días	vie 15/06/07	mié 20/06/07	32 horas	95%	
48	Reportes de Clientes	7 días	jue 14/06/07	vie 22/06/07	48 horas	100%	
49	Implementación de 10 reportes básicos	4 días	jue 14/06/07	mar 19/06/07	24 horas	100%	
50	Implementación de 3 reportes estadísticos	3 días	mié 20/06/07	vie 22/06/07	24 horas	100%	
51	CRM	16 días	lun 25/06/07	mar 17/07/07	160 horas	100%	
52	Implantación	9,5 días	mié 18/07/07	mié 01/08/07	136 horas	96%	
53	Pruebas internas	2 días	mié 18/07/07	jue 19/07/07	32 horas	100%	
54	Ajustes recomendados	2 días	vie 20/07/07	lun 23/07/07	16 horas	100%	
55	Documentación	5 días	mié 18/07/07	mié 25/07/07	40 horas	100%	
56	Adiestramiento	1,5 días	jue 26/07/07	vie 27/07/07	24 horas	100%	
57	Pruebas de Certificación	3 días	vie 27/07/07	mié 01/08/07	24 horas	80%	
58	Directorios de Clientes implantado	0 días	mié 01/08/07	mié 01/08/07	0 horas	0%	
59	Reportes y Estadísticas de Clientes implantado	0 días	mié 01/08/07	mié 01/08/07	0 horas	0%	
60	CRM implantado	0 días	mié 01/08/07	mié 01/08/07	0 horas	0%	
61	Adiestramiento Asterisk	3 días	lun 18/06/07	jue 21/06/07	0 horas	100%	
62	Fase III - Integración	62,1 días	jue 21/06/07	mié 19/09/07	1.490 horas	24%	
63	Vista	40 días	jue 21/06/07	vie 17/08/07	650 horas	60%	
64	MegaSoft	24 días	mié 01/08/07	mar 04/09/07	480 horas	10%	
65	Pagina Web	15,5 días	mié 01/08/07	lun 10/09/07	200 horas	5%	
66	Implantación	22,1 días	lun 20/08/07	mié 19/09/07	160 horas	0%	
67	Pruebas internas	15 días	lun 20/08/07	vie 07/09/07	16 horas	0%	
68	Ajustes recomendados	2 días	lun 10/09/07	mar 11/09/07	40 horas	0%	
69	Documentación	15 días	lun 20/08/07	vie 07/09/07	40 horas	0%	
70	Adiestramiento	1,1 días	jue 13/09/07	vie 14/09/07	24 horas	0%	

Proyecto: Planning Cines Unidos
Fecha: lun 27/08/07

Tarea



Hito



Tareas externas



División



Resumen



Hito exteTarea



Progreso












Resumen del proyecto




División




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Trabajo	% completado	
						completado	abri
71	Pruebas de Certificación	3 días	vie 14/09/07	mié 19/09/07	40 horas	0%	
72	<i>N2C y Vista Integrados</i>	0 días	mié 19/09/07	mié 19/09/07	0 horas	0%	
73	<i>N2C y Merchant integrados</i>	0 días	mié 19/09/07	mié 19/09/07	0 horas	0%	
74	<i>N2C y Página web integrados</i>	0 días	mié 19/09/07	mié 19/09/07	0 horas	0%	
75	Fase IV - Independencia	8 días	vie 14/09/07	mié 26/09/07	184 horas	0%	
76	Pruebas Independencia	5 días	vie 14/09/07	vie 21/09/07	160 horas	0%	
77	Independizarse del proveedor actual	3 días	vie 21/09/07	mié 26/09/07	24 horas	0%	
78	<i>Cines Unidos independizado de Proveedor Actual</i>	0 días	mié 26/09/07	mié 26/09/07	0 horas	0%	
79	Etapa II - Hacia al e_Business	56,38 días	mié 26/09/07	vie 14/12/07	1.042 horas	0%	
80	Cartelera Cinematográfica	12 días	mié 26/09/07	lun 15/10/07	120 horas	0%	
81	Integración Call Center	30 días	mié 26/09/07	jue 08/11/07	200 horas	0%	
82	<i>Integración con Asterisk (**)</i>	13 días	jue 08/11/07	mar 27/11/07	250 horas	0%	
83	Integración Tienda Cines Unidos	24 días	lun 15/10/07	vie 16/11/07	100 horas	0%	
84	Integración Taquilla	15,38 días	jue 08/11/07	jue 29/11/07	200 horas	0%	
85	Pruebas internas	2,5 días	jue 29/11/07	lun 03/12/07	40 horas	0%	
86	Documentación	2,5 días	lun 03/12/07	jue 06/12/07	40 horas	0%	
87	Adiestramiento	2 días	jue 06/12/07	lun 10/12/07	32 horas	0%	
88	Pruebas de Certificación	4 días	lun 10/12/07	vie 14/12/07	60 horas	0%	
89	<i>Cartelera Cinematográfica implantada</i>	0 días	vie 14/12/07	vie 14/12/07	0 horas	0%	
90	<i>Integración Call Center implantado</i>	0 días	vie 14/12/07	vie 14/12/07	0 horas	0%	
91	<i>Integración Tienda Cines Unidos implantado</i>	0 días	vie 14/12/07	vie 14/12/07	0 horas	0%	
92	Etapa III - Inteligencia de Negocio	40 días	vie 14/12/07	mié 13/02/08	548 horas	0%	
93	Integración con InfoWorks	40 días	vie 14/12/07	mié 13/02/08	450 horas	0%	
94	Evaluación tecnológica de Pentaho	10 días	vie 14/12/07	mié 02/01/08	98 horas	0%	
95	Gerencia de Proyectos	205 días	jue 03/05/07	jue 21/02/08	870 horas	35%	
96	Cierre	0,5 días	vie 22/02/08	vie 22/02/08	8 horas	0%	

Proyecto: Planning Cines Unidos Fecha: lun 27/08/07	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito exteTarea	
	Progreso		Resumen del proyecto		División	

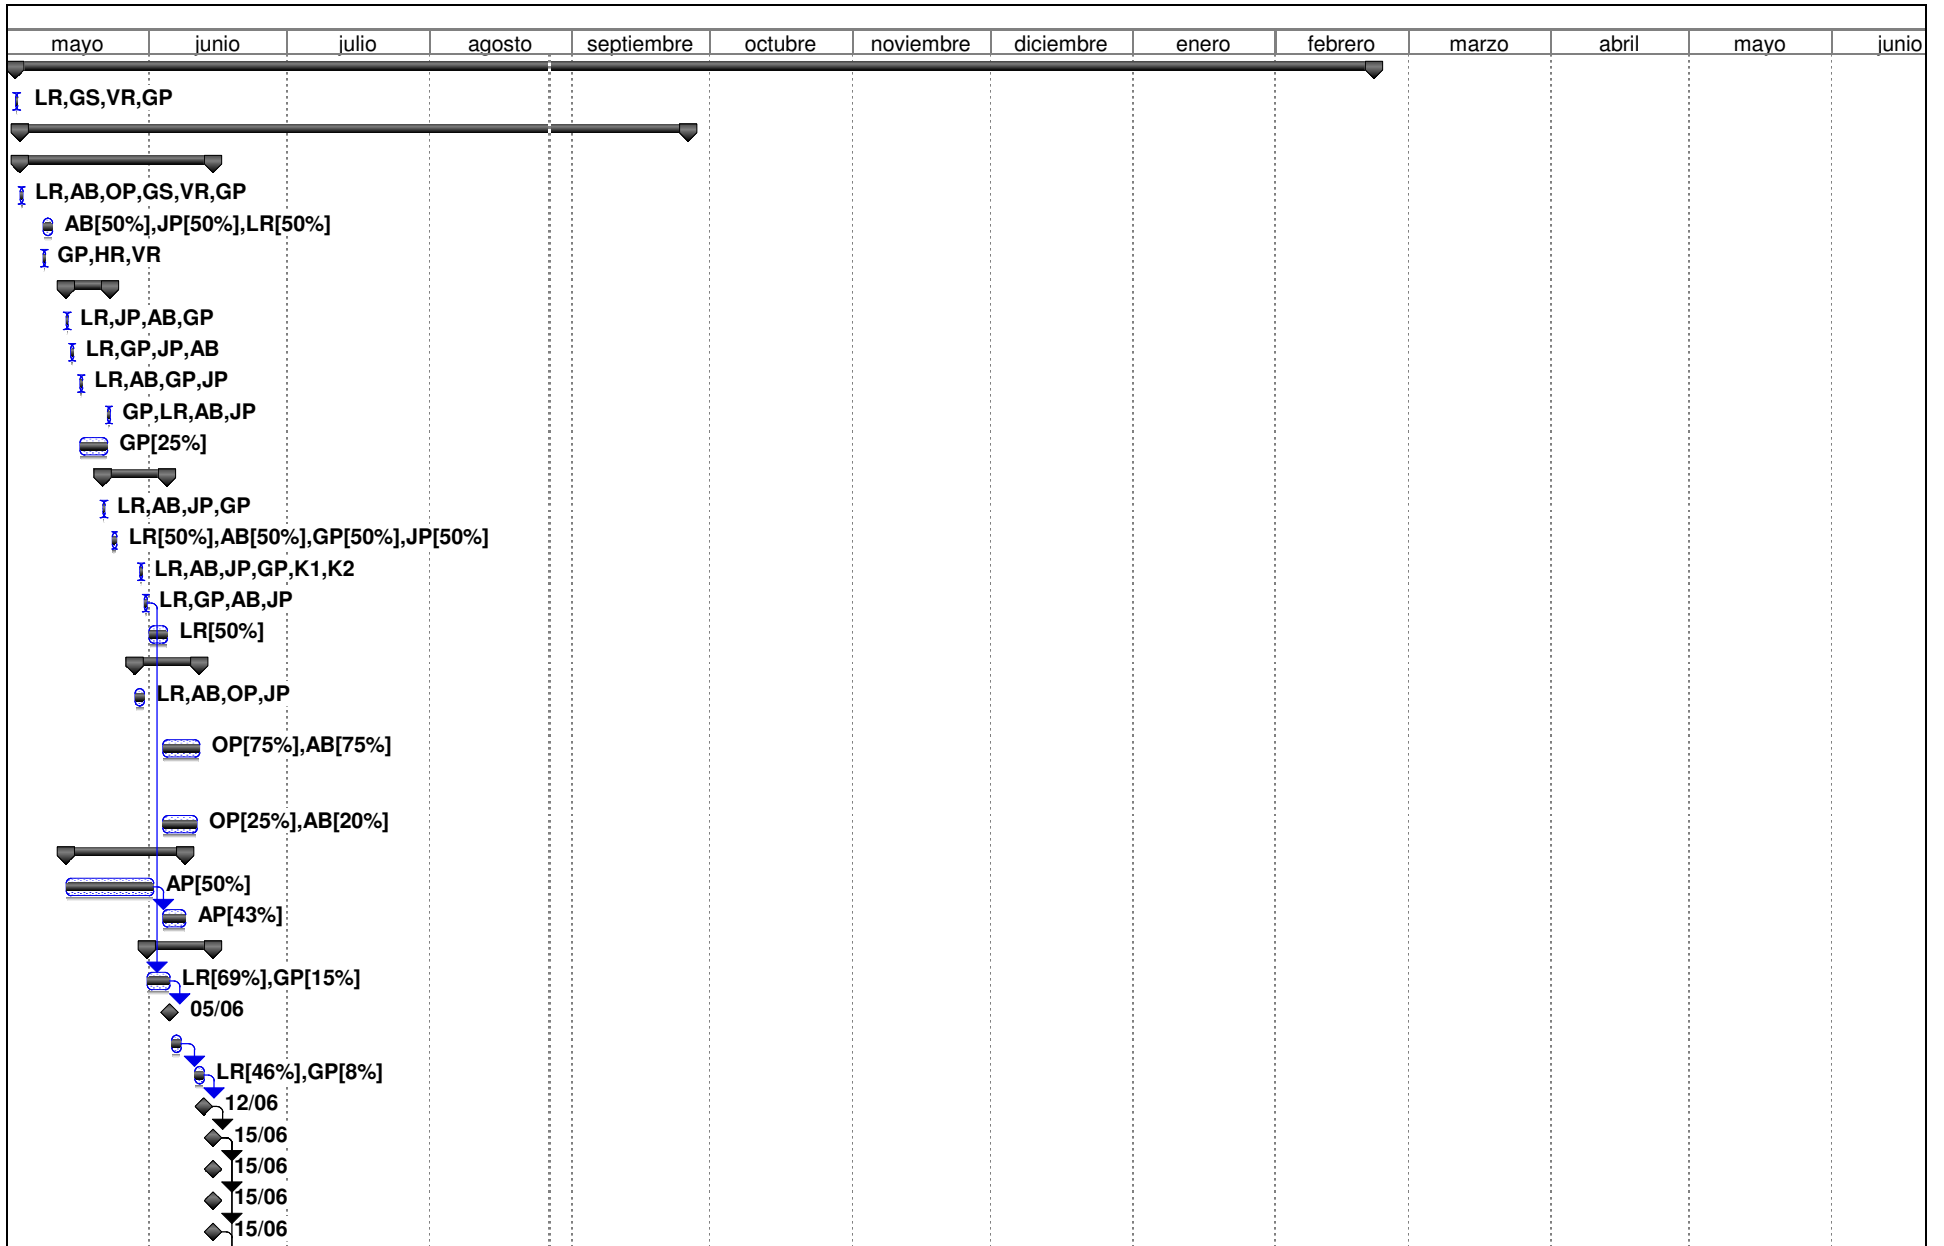




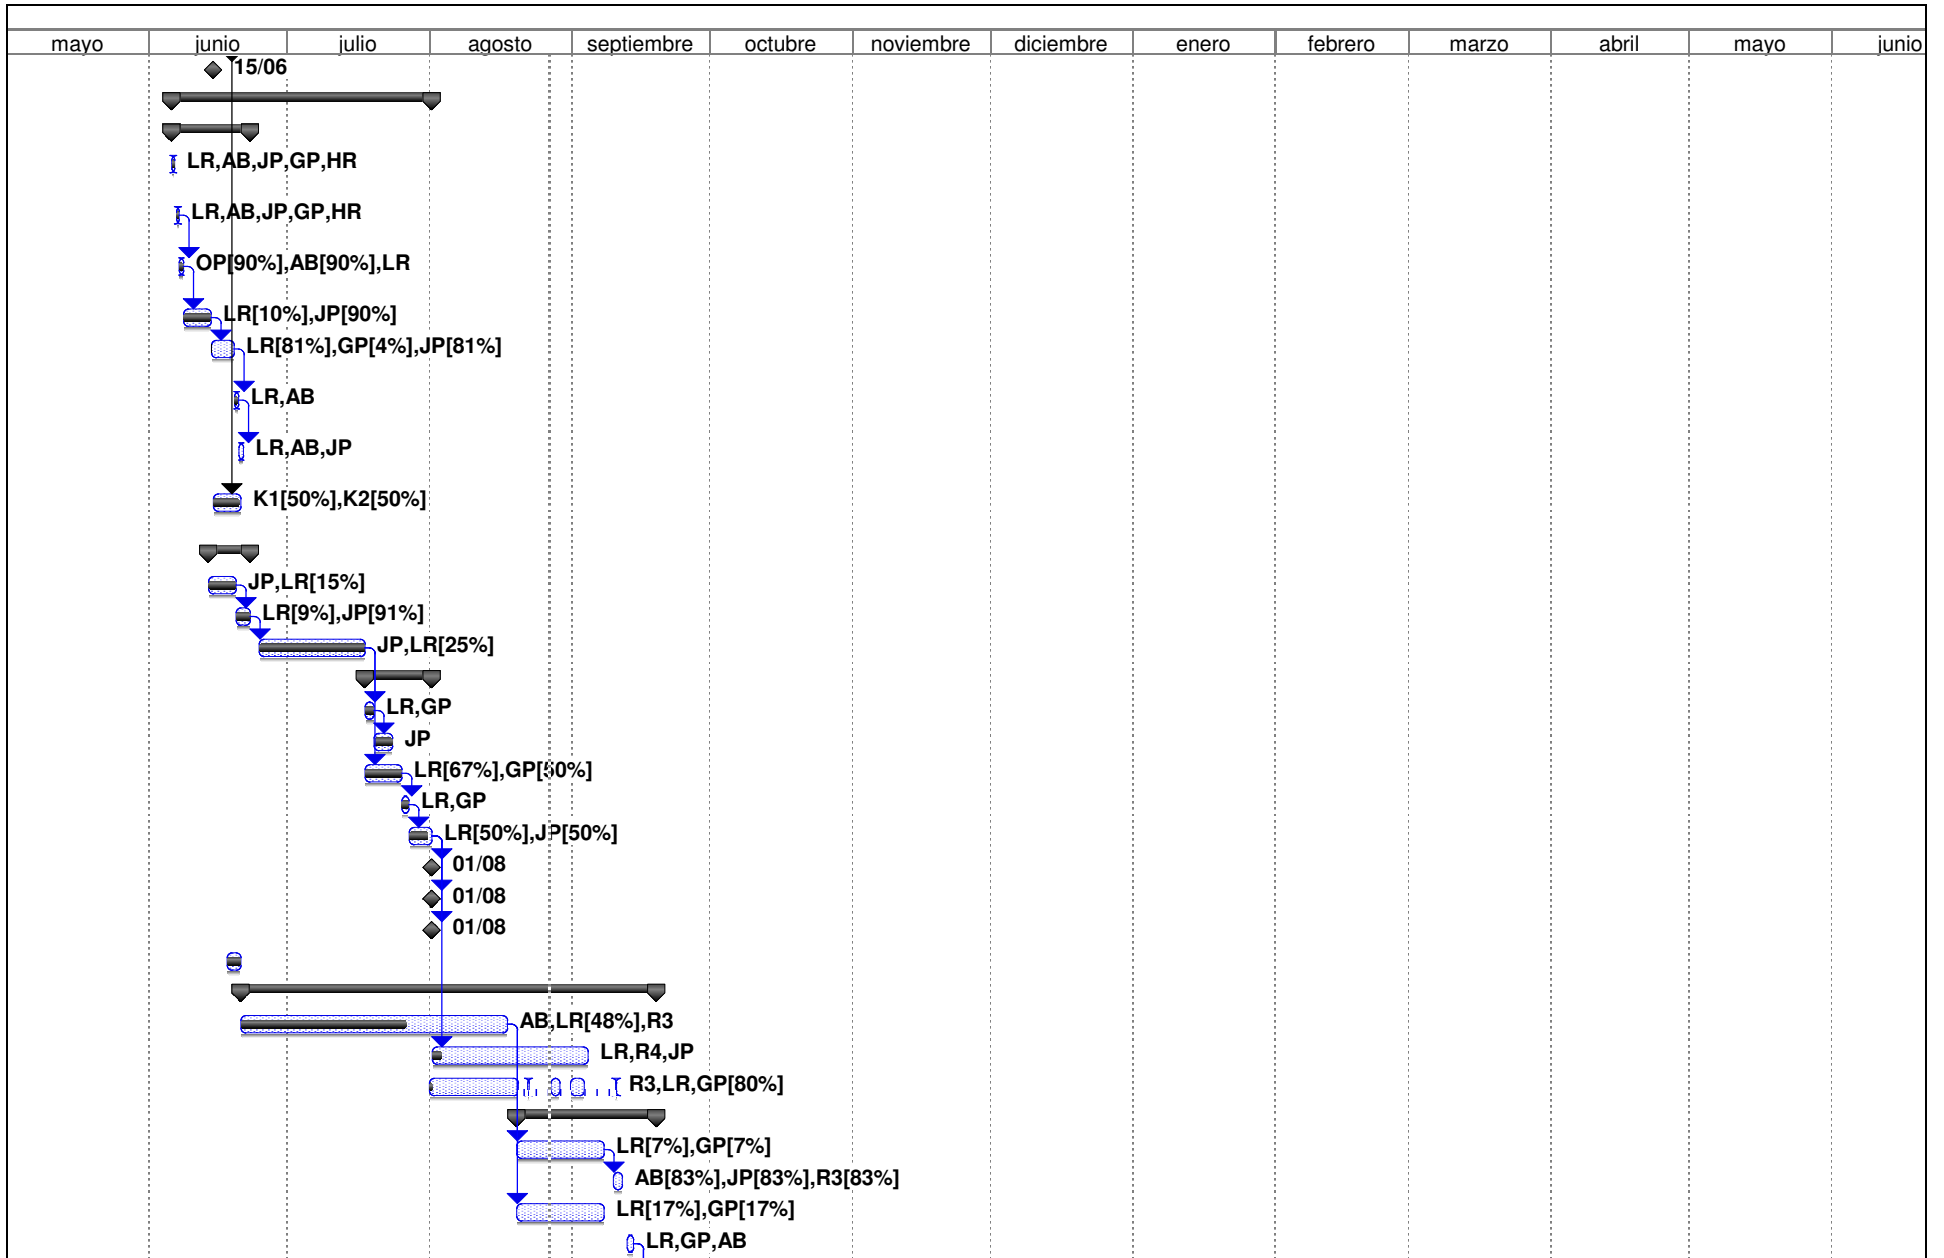


Proyecto: Planning Cines Unidos
 Fecha: lun 27/08/07

Tarea		Hito		Tareas externas	
División		Resumen		Hito exteTarea	
Progreso		Resumen del proyecto		División	




Proyecto: Planning Cines Unidos
 Fecha: lun 27/08/07

Tarea 
 División 
 Progreso 

Hito 
 Resumen 
 Resumen del proyecto 

Tareas externas 
 Hito exteTarea 
 División 

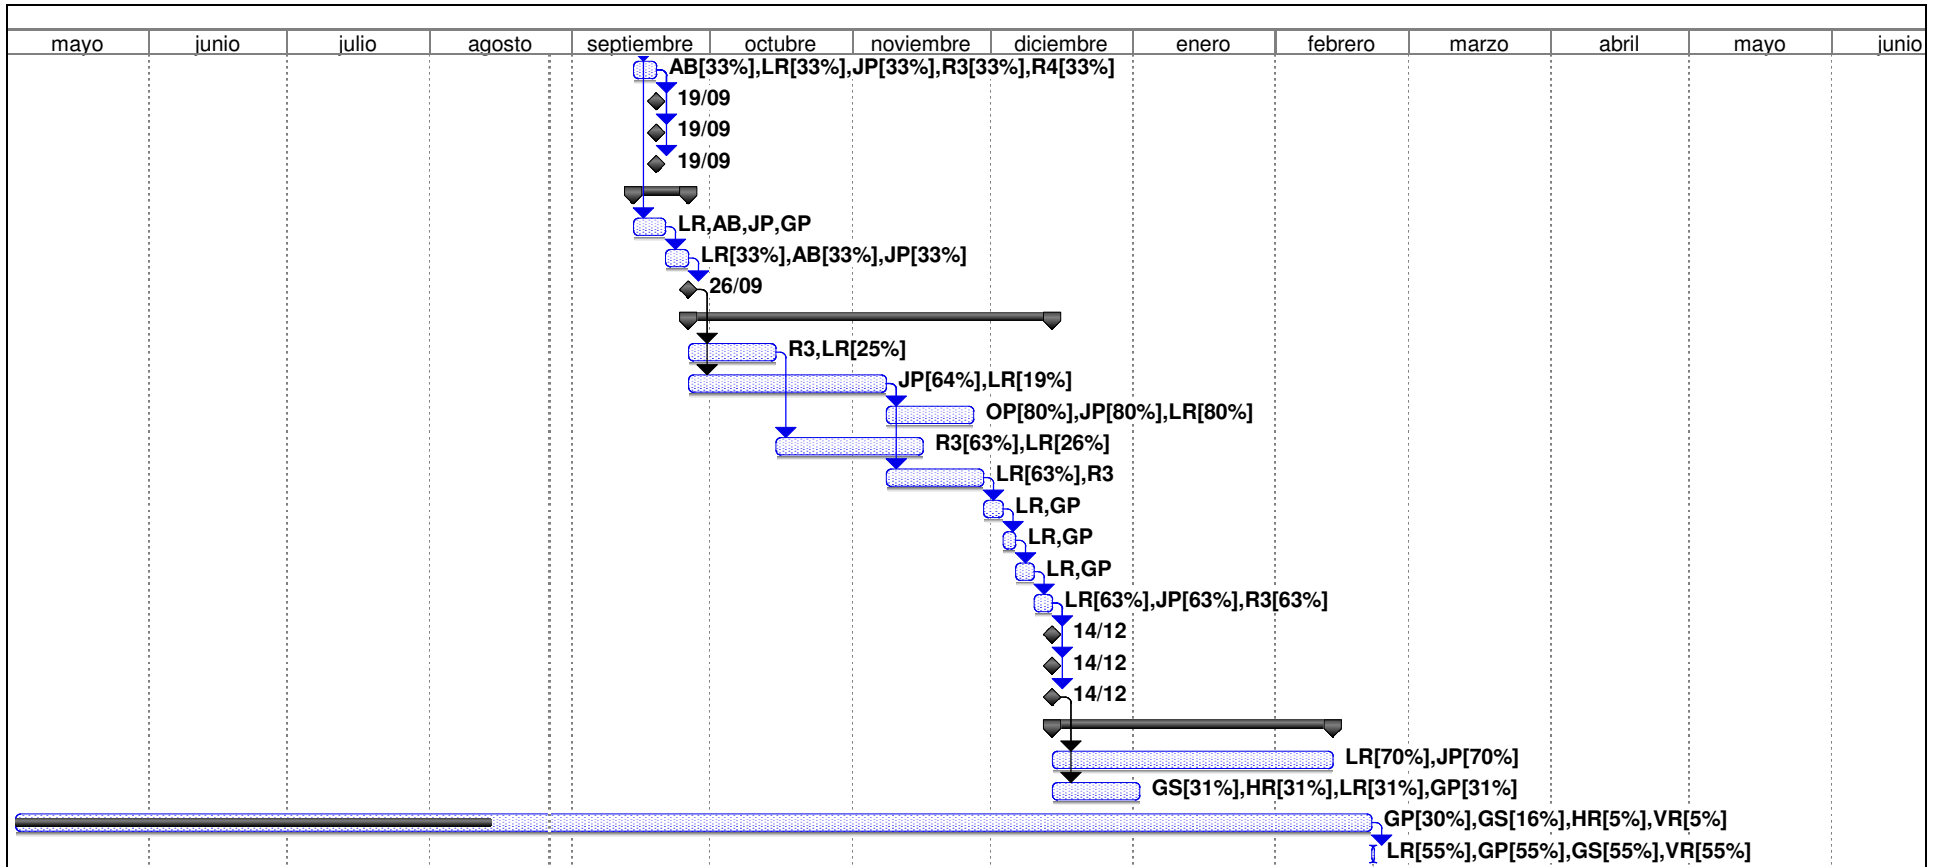

Proyecto: Planning Cines Unidos Fecha: lun 27/08/07	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito exteTarea	
	Progreso		Resumen del proyecto		División	
