

¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):

- Pruebas internas y Ajustes en Bloque de Proforma
- Pruebas de Mirit de Proformas

¿Qué debería haber pasado?

La funcionalidad de Fcaturación PDVSA ya debería estar en Producción

¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (incluir Áreas de Atención)


- Complicaciones en diseño y desarrollo

¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)

Contamos con el apoyo de un desarrollador extra por dos semanas que permitió completar las funcionalidades de Anulación y Consulta de Facturas y registro de Auditoría de Cambios.

Se requiere ahora que se hagan los ajustes sobre observaciones obtenidas tanto de pruebas internas como de pruebas del cliente.

Para no retrasar más el pase a producción se sugiere hacer el pase con las funcionalidades, sin los reportes, y una vez en producción, continuar con la elaboración de Reportes. Sin embargo, de igual manera es menester ya tener definidos los 5 reportes para la próxima semana.

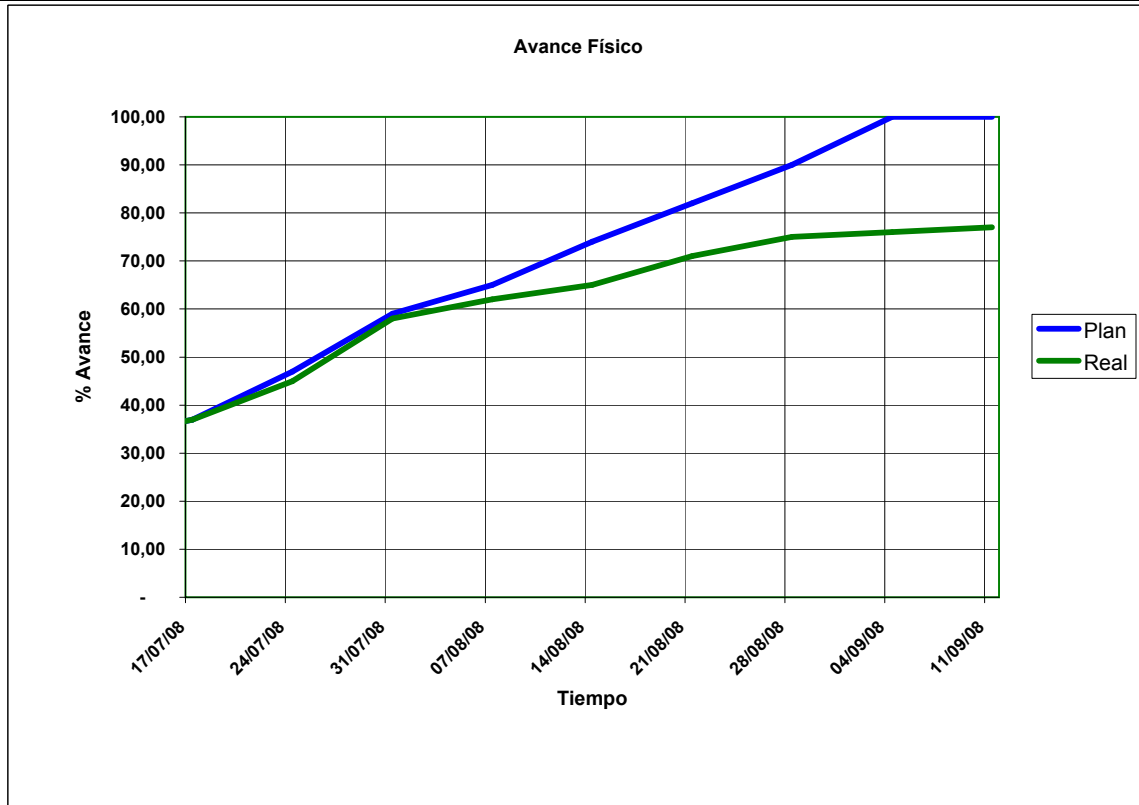

Fecha	17-jul	24-jul	31-jul	7-ago	14-ago	21-ago	28-ago	4-sep	11-sep
Programado	37,00	47,00	59,00	65,00	74,00	82,00	90,00	100,00	100,00
Real	37,00	45,00	58,00	62,00	65,00	71,00	75,00	76,00	77,00



Leyenda	
◆	Desviación ≤ 5%
◆	Desviación > 5% y Desviación ≤ 10%
◆	Desviación > 10%
