



**¿Qué pasó? (Actividades realizadas desde el último seguimiento):**

- Sólo se trabajó en el Módulo de Contacto
- Hubo inconvenientes técnicos para pase de archivos al servidor que contribuyeron con el tiempo de respuesta en la solución de fallas en el Módulo de Contacto

**¿Qué debería haber pasado?**


- Haber pasado a producción el Módulo de Contacto
- Haber ajustado la integración con Sitio Web con las listas de valores de Ciudad, Estado y Cinemas reales
- Haber finalizado la integración con Transacciones Web

**¿Por qué tenemos una diferencia entre lo que pasó y lo que debería haber pasado? (Incluir Áreas de Atención)**

- Retrasos en Ajustes del Módulo de Contacto en Pippin

**¿Qué debemos hacer para mantenernos dentro del Plan? (Próximas Actividades y Responsables)**

- Sigue pendiente:
  - Obtener lista de valores de Estados
  - Obtener diccionario de datos de la tabla de transacciones
- GWT cambiará el Líder Técnico (debido a la salida del Líder Técnico actual) y pondrá a dos personas más de apoyo en una dedicación de 50% al proyecto cada uno de estos tres integrantes

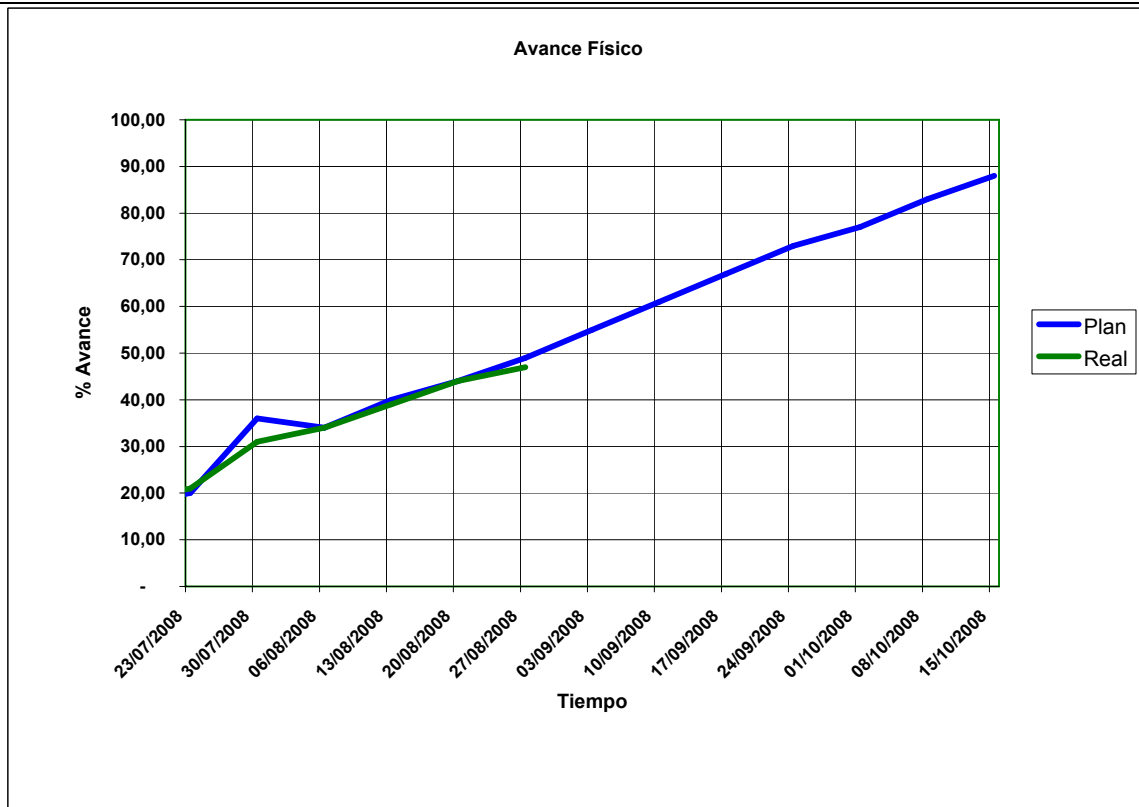

Fecha	23-jul	30-jul	6-ago	13-ago	20-ago	27-ago	3-sep	10-sep	17-sep	24-sep
Programado	20,00	36,00	34,00	40,00	44,00	49,00	55,00	61,00	67,00	73,00
Real	21,00	31,00	34,00	39,00	44,00	47,00	50,00	52,00	0,00	0,00



Fecha	1-oct	8-oct	15-oct	22-oct	29-oct				
Programado	77,00	83,00	88,00	93,00	100,00				
Real	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Replanificación

Legenda	
	Desviación  <= 5%
	Desviación  > 5% y  Desviación  <= 10%
	Desviación  > 10%
